

報 告 書

和田区長 殿

2023年6月18日

ユーフーズ(株)泉南男里工場

工場長 高橋弘光

場所	泉南市男里6丁目825-1 ユーフーズ(株)泉南男里工場敷地内
発生内容	工場敷地内で異臭の発生
原因	前回送風機を設置して以来、異臭は改善できましたが、汚泥の脱水機付近で臭気が確認されたため追加の工事を実施いたしました。
是正処置	脱水機建屋に壁を設置し、建屋内に脱臭剤(エポリオン)を設置いたしました。  改善前 改善後

進 捗 状 況 報 告 書


和田区長 殿

2023年6月19日

ユーフーズ(株)泉南男里工場

工場長 高橋弘光

場所	泉南市男里6丁目825-1 ユーフーズ(株)泉南男里工場敷地内
報告内容	汚泥のキャリーオーバーに対する対策
経過報告	5/18より浄化槽の点検(2回/日)を実施しておりますが、6/18現在で汚泥の流出は確認しておりません。 測定器による点検の数値も 流入水PH4.8～5.2 汚泥濃度 6000→5200mg/L 溶存酸素 0.8～1.1mg/Lと安定した数値となっております。 汚泥濃度に関しては4500mg/Lになるよう汚泥の脱水作業を実施しております。
恒久対策について	浄化槽管理会社と協議をした結果、自動薬注ポンプを導入するよう決定しました。(沈殿槽へ界面センサーを取り付け、センサーが汚泥の浮上を感知し自動で凝集剤を投入する装置) ※設置図面は別紙参照 東洋 スクリーン工業(株)のスクリーンのサンプルテストの実施結果につきましては、完全に汚泥は除去できず、不採用となりました。
下水道利用について	前回の協議の際に下水道の利用も検討して欲しいとの依頼につきまして弊社にて協議した結果、既存の浄化設備を修繕し最善を尽くし、効果が得られなかった際に再度検討することとなりました。

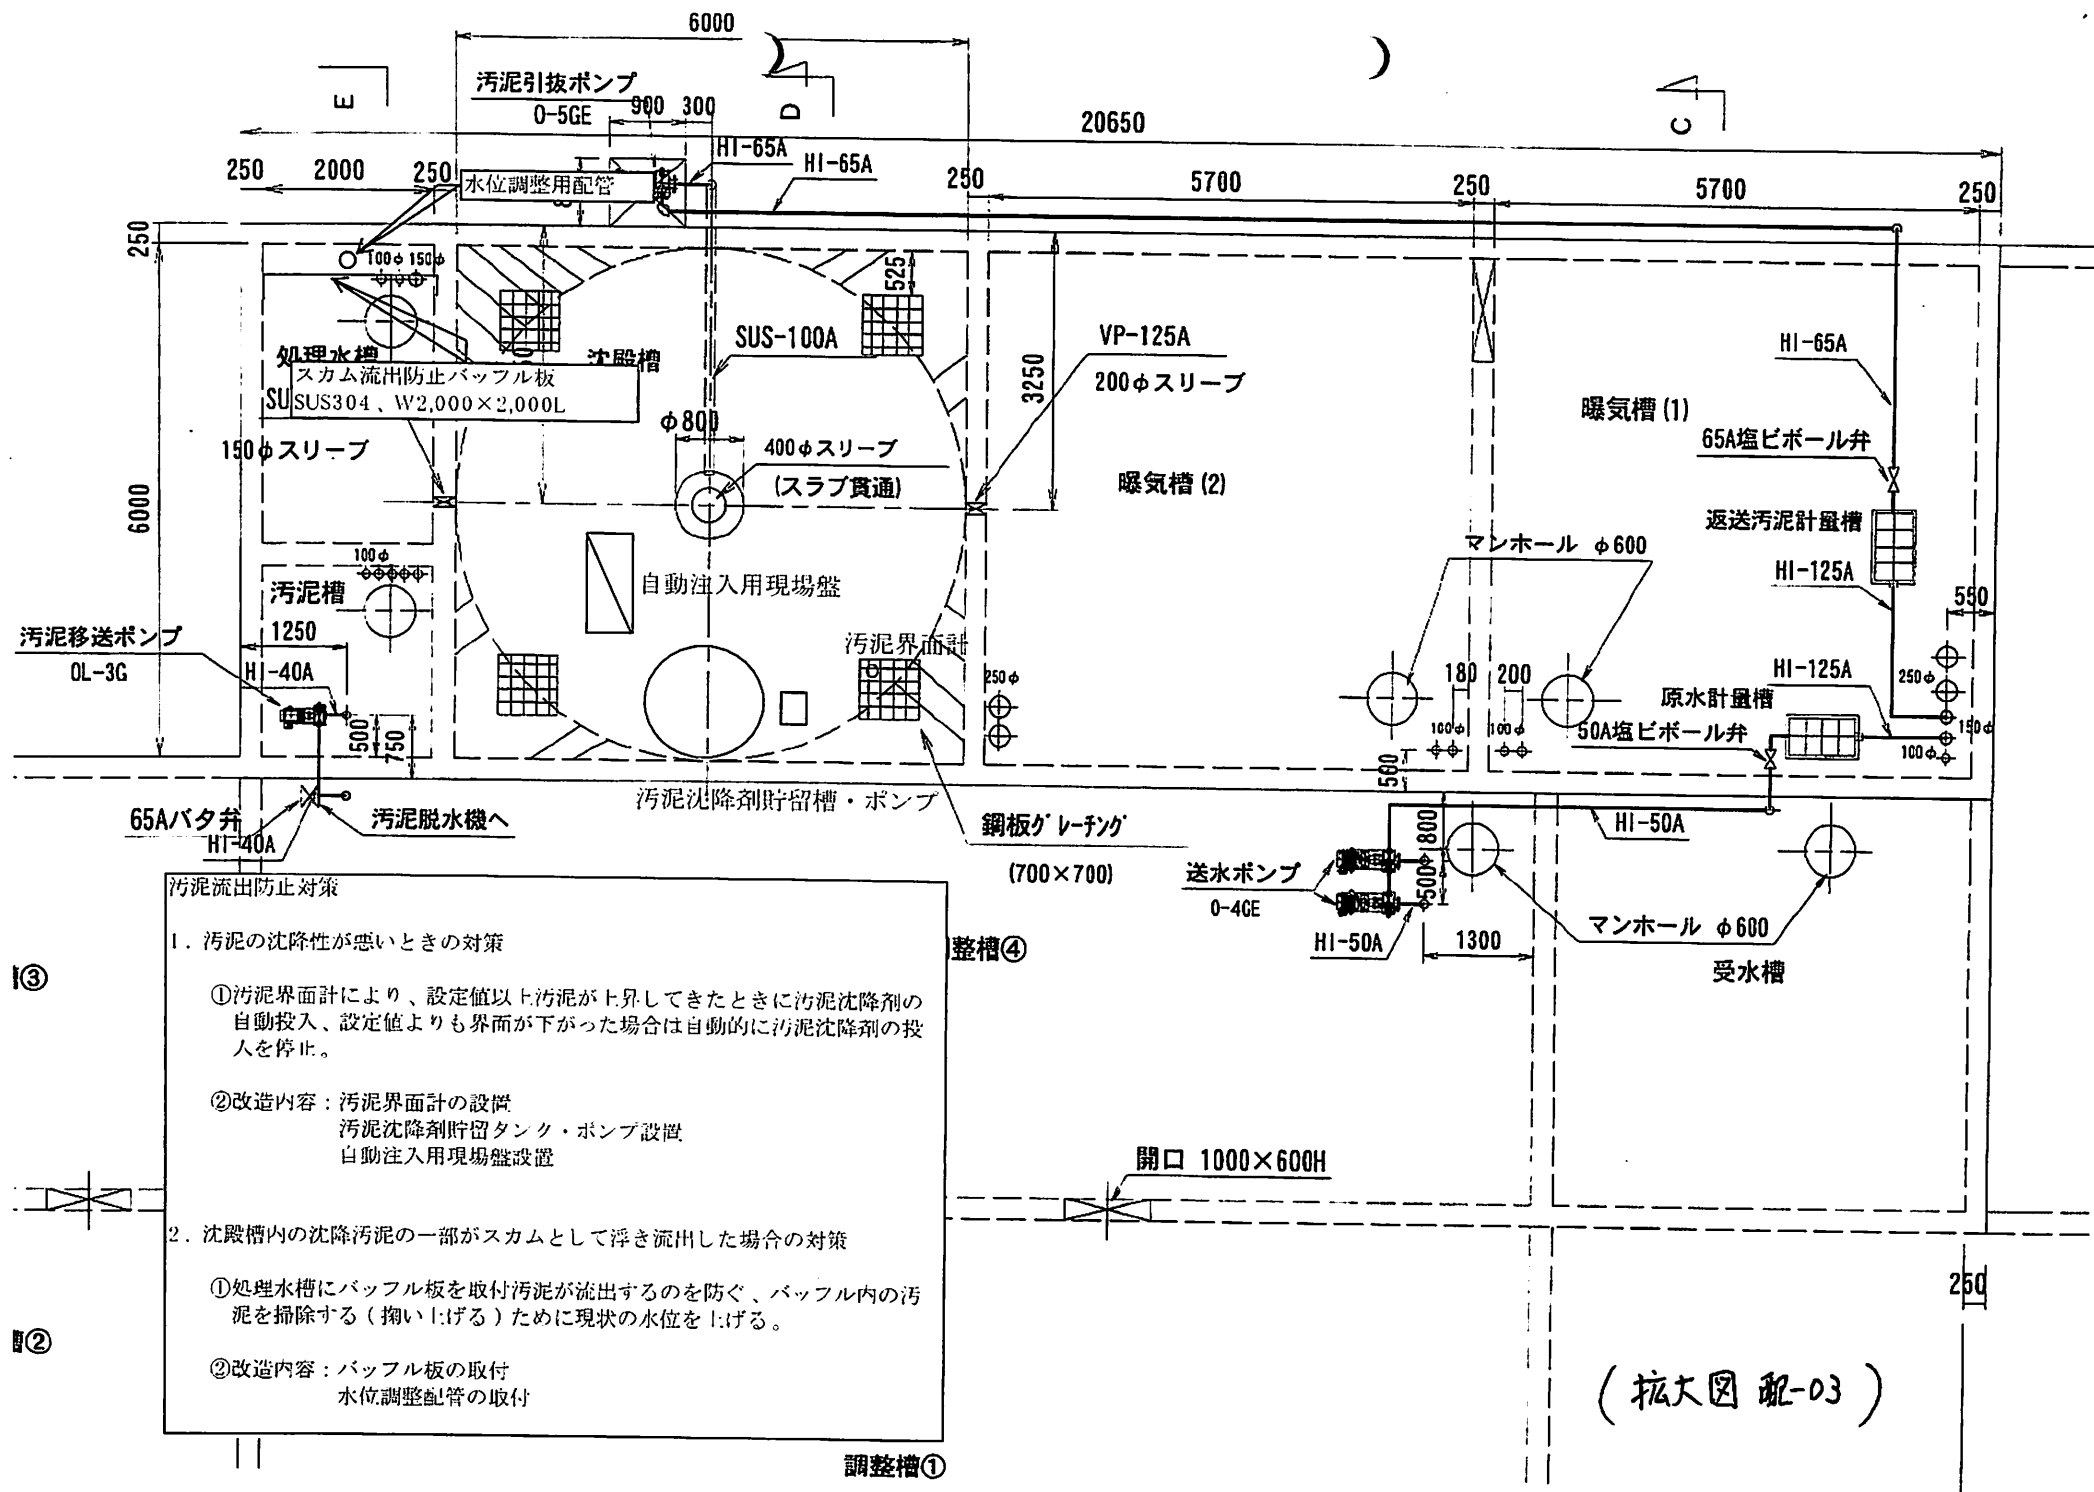

工場周辺環境記録表

2023年 5月度 測定記録

日付	曜日	時刻	MLSS	DO	PH	沈殿槽	工場外周 臭気			測定者
			測定値	測定値	測定値	濁り	勝手口	玄関	浄化槽	
5/1	月曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/2	火曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/3	水曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/4	木曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/5	金曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/6	土曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/7	日曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/8	月曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/9	火曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/10	水曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/11	木曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/12	金曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/13	土曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/14	日曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/15	月曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/16	火曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/17	水曜日	⋮	mg/l	mg/l						
		⋮	mg/l	mg/l						
5/18	木曜日	8:10	5200mg/l	0.8mg/l	5.7	0	0	0	0	高橋
		17:05	5800mg/l	0.8mg/l	5.6	0	0	0	0	高橋
5/19	金曜日	8:17	5700mg/l	0.9mg/l	5.5	0	0	0	0	高橋
		18:07	5800mg/l	0.8mg/l	5.2	0	0	0	0	高橋
5/20	土曜日	8:05	5800mg/l	0.8mg/l	5.3	0	0	0	0	高橋
		17:25	5700mg/l	0.9mg/l	5.1	0	0	0	0	高橋
5/21	日曜日	7:50	5700mg/l	0.9mg/l	5.0	0	0	0	0	金城
		17:05	5700mg/l	0.9mg/l	4.9	0	0	0	0	金城
